# 기능시험 평가지

#### **Task Instructions for Skills Test**

업종	건설업	세부분야	철근
Job Category	Construction	Subject	Rebar

#### 평가시간 Test Duration: 8분 8minutes

#### 1. 과제의 구성 Test Procedure

구분	세부 과제명	평가시간
Procedure	Test Subject	Test Duration
Test 1	핀 꽂기 Insert Pins	1 min
Test 2	철근 조립 Assembling & fixing rebar	7 min

#### II. 요구사항 및 도면 Requirements and diagram

#### Test 1. 핀 꽂기 Insert Pins

### 1. 요구사항 Requirements


● 도면에 따라 주어진 작업판에 지급된 핀을 색상, 모양, 크기에 맞게 꽂으십시오. Considering the diagram, insert the pins in to the slate provided according to the color, size and shape.

### 2. 도면 diagram

[ 핀 꽂이 판 Pin Board : Size : 380 x 380mm ]



업종	건설업	세부분야	철근
Job Category	Construction	Subject	Rebar

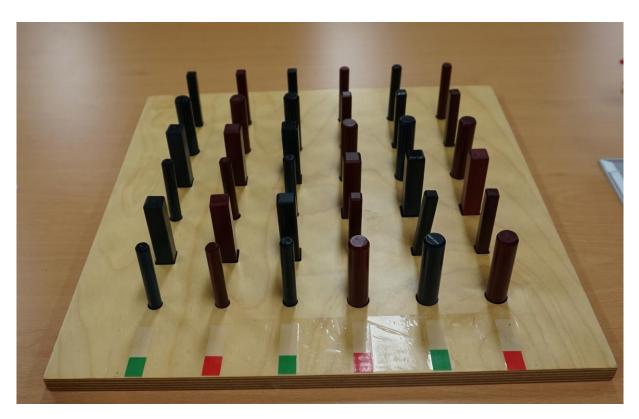

<좌측면> Left Side image



<정면> Front Side image

업종	건설업	세부분야	철근
Job Category	Construction	Subject	Rebar

# Test 2. 철근 조립 Assembling rebar


# 1. 요구사항 Requirements

▶ 정해진 시간 내에 도면에 따라 철근결속 작업을 수행하십시오.

You must perform the rebar fixing task within the given time according to the diagram.


# 2. 도면 diagram

(단위 Unit: mm)

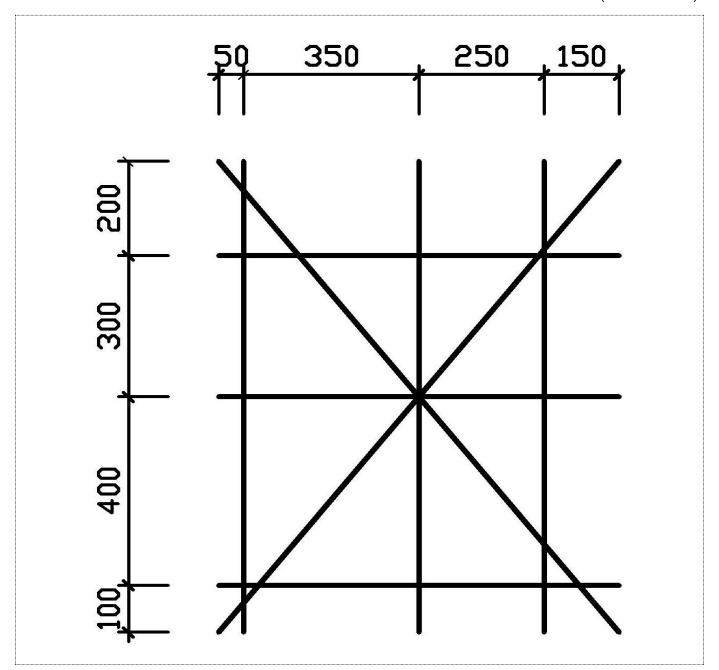

업종 건설업 세부분야 철근 Job Category Construction Subject Rebar

< 작업 유의사항>

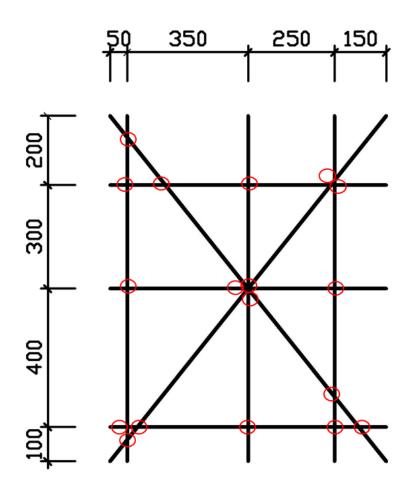

- ▶ 결속선 및 결속핸들을 정확한 방법으로 사용하여 작업을 수행하십시오.
   Each task involving a tying wire or handle must be performed accurately.
- ▶ 결속 위치와 결속개수가 일치하도록 작업을 수행하십시오.

Make sure that the tying location and the number of ties are in accordance with the requirements.

- ▶ 모든 철근 결속점은 각각 결속하시오.
  - Bind the every binding point.
- ▶ 도면치수와 일치하도록 작업을 수행하십시오.

Make sure that your work is in accordance with the specification on the diagram.

▶ 평가 후 해체작업을 수행하십시오.

After the evaluation, disassemble your works.

업종	건설업	세부분야	철근
Job Category	Construction	Subject	Rebar

### III. 응시자 유의사항 Guideline for Applicants

1. 안전사고가 나지 않도록 유의하십시오.

Make sure to prevent safety accidents.

2. 작업이 완료될 때까지 안전용구는 반드시 착용하십시오.

You must wear the personal safety gear at all times until the task is completed.

3. 평가 시작 전 지급된 재료의 이상유무를 확인하여 이상이 있을 때에는 평가위원의 확인을 받아 교환하십시오. 평가 중 재료의 추가지급이나 교환은 할 수 없습니다.

Before examination, please check whether the supplied materials are in normal conditions. In case there is a problem, replace the material upon the examiner's confirmation. It is not allowed to receive additional materials or replace materials during examination.

4. 평가시간이 종료되면 작업을 다 못하였더라도, 모든 공구를 내려 놓고 작업을 종료하여야 합니다.

When the examination time is up, you must put every tool down and stop what you were doing even when the job is unfinished.

5. 다음의 경우 0점 처리되므로 유의하십시오.

Please be aware of the fact that in any of the following cases you will be given a 0.

- 지급재료 외에 재료를 사용한 경우
   In case you used a material other than supplied ones
- ➤ 작품이 도면과 현저히 다른 경우(치수, 형태, 조립상태 등)
  In case the work is significantly different from the diagram(in size, shape, assembly, etc.)
- ▶ 안전사고가 발생한 경우

In case there has been a safety accident

▶ 평가시간 종료 후에도 계속 작업하는 경우In case you keep working after the examination time is up

건설업	세부분야	철근	
Construction	Subject	Rebar	
	건설업 Construction		

Ⅳ. 평가장 시설 및 공구			세부분야 Subject	철근 <b>Rebar</b>		
List of Test Facilities and tools		Subject 규 격	LLOI		Rebai 비고	
구 분 Type	일련번호 Serial No.	장비 및 시설명 Equipment & Facilities	ਸ ੀ Spec.	단위 Unit	수 량 QTY	Remarks
공통 Common		철근시험장 Test place for iron bar	포장바닥,지붕 paved floor, ceiling	-	-	
1 과제 Test1	1	작업대 Workbench	1,400x1,000x700mm	개 PCS	2	
//	2	핀 꽂이 세트 Pin Set	제작 manufacture	셋 SET	2	핀:36개 Pin:36 pcs 핀 박스 Pin Box 핀 꽂이 판 Pin Board
//	3	스톱워치 Stop Watch	연속형 공업표준 industrial standard	개 PCS	2	
2 과제 Test2	4	이형 철근 Distinct iron bar	D10 × 800 mm	개 EA	3	1 인당 Per 1 person
//	5	이형 철근 Distinct iron bar	D10 × 1,000 mm	개 EA	3	1 인당 Per 1 person
//	6	이형 철근 Distinct iron bar	D10 × 1,200 mm	개 EA	2	1 인당 Per 1 person
//	7	결속선 Wire for fixing	# 20 번(길이 350mm) # 20 (length of 350mm)	개 EA	40	1 인당 Per 1 person
공통	8	니퍼 Nipper	소형 Small size	개 EA	1/인 1/person	결속선 절단용 for cutting wire
//	9	결속기핸들 Fixing tool (handle)	철근결속용 for joining rebar	개 EA	6	1반당 per 1class
//	10	줄 자 Ruler	1 m 이상 1m or more	개 EA	6	1반당 per 1class
//	11	필기구 Writing tools	결속위치표시용 for indicating locations to fix	개 EA	1	1 인당 Per 1 person
//	12	안전모 Safety helmet		개 EA	1	1 인당 Per 1 person
//	13	안전장갑 Safety globe		개 EA	1	1 인당 Per 1 person
